

REKAP PROGRES MINGGUAN

PROGRAM REVITALISASI SEKOLAH TAHUN 2026

14 SEPTEMBER 2026 - 19 SEPTEMBER 2026

NAMA SEKOLAH : SMP Negeri 1 Seririt
KOTA/ KAB. : Buleleng
PROPINSI : Bali

No	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN		KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU		KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI		TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI
		BIAYA	BOBOT	BIAYA	BOBOT	BIAYA	BOBOT	
			%		%		%	
I.	BIAYA KONSTRUKSI							
1	PERSIAPAN	15.700.000,00	2,00	-	-	9.300.000,00	1,18	1,18
II	PEMBANGUNAN RPS							
1	Pekerjaan Persiapan	28.273.867,54	3,59	28.273.867,54	3,59	-	-	3,59
4	Pekerjaan Beton	25.577.727,65	3,25	25.577.727,65	3,25	-	-	3,25
6	Pekerjaan Pintu dan Jendela	23.028.171,80	2,93	-	-	-	-	-
7	Pekerjaan Kuda dan Penutup Atap	218.915.332,53	27,82	114.729.483,71	14,58	57.337.393,93	7,29	21,87
8	Pekerjaan Plafond	132.868.703,21	16,89	-	-	36.472.554,36	4,64	4,64
9	Pekerjaan Lantai dan Keramik	47.169.047,25	6,00	25.144.177,50	3,20	16.762.785,00	2,13	5,33
10	Pekerjaan Cat dan Penutup Dinding	68.697.300,72	8,73	-	-	-	-	-
11	Pekerjaan Instalasi Listrik	22.028.320,00	2,80	-	-	-	-	-
12	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	14.282.200,00	1,82	-	-	-	-	-
26	Pekerjaan Jalan Masuk (ENTRANCE) Utama Dari Gerbang Ke Kantin	49.559.000,00	6,30	-	-	-	-	-
III	PERABOT DAN INTERIOR							
1	Moubiler dan interior	99.400.000,00	12,63	-	-	-	-	-
IV	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN	26.665.000,00	3,39	12.355.000,00	1,57	-	-	1,57
IV.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI	14.615.000,00	1,86	-	-	-	-	-
TOTAL		786.779.670,70	100,00	206.080.256,40	26,19	119.872.733,29	15,24	41,43
RENCANA (%)								37,20
REALISASI (%)								41,43
DEVIASI (%)								4,23

Mengetahui
Ketua P2SP



(Ketut Suarjana)

Tim Teknis (Pengawas)



(I Gusti Putu Meindrawan, S.T.)

Seririt, 19 September 2026
Kepala Pelaksana,



(I M Panji Pradana, S.Pd)

PROGRAM REVITALISASI SEKOLAH TAHUN 2026

JENIS KONSTRUKSI : *beton*

(I M Panji Pradana, S.Pd)

PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Ruang Kelas 9E/7E

Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 SERIRIT

NPSN : 50100321

Kab/Kota : BULELENG

Provinsi : BALI

Minggu/Bulan ke : 7 / II

Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	
I.	PEK. PERSIAPAN											
1	Pek. Bongkar Rangka Atap Genteng dan Reng Stuktur Kayu	132,51	14.200,00	1.881.642,00	1,66	132,51	1.881.642,00	1,66	-	-	-	1,66
2	Pek. Bongkar Kuda-Kuda/ Gording/ Balok Kayu	1,51	1.573.560,00	2.381.639,71	2,10	1,51	2.381.639,71	2,10	-	-	-	2,10
3	Pek. Bongkar Plapond Termasuk Rangka Kayu/ Hollow	104,80	17.280,00	1.810.926,72	1,60	104,80	1.810.926,72	1,60	-	-	-	1,60
II.	PEKERJAAN BETON											
1	Pek. Beton Ring Balok 1:2:3 (R3 15/20)	0,96	1.545.730,00	1.483.900,80	1,31	0,96	1.483.900,80	1,31	-	-	-	1,31
2	Pasang bekisting untuk balok + bongkar	27,20	66.790,00	1.816.688,00	1,61	27,20	1.816.688,00	1,61	-	-	-	1,61
3	Pembesian dengan besi polos atau ulir	164,40	17.640,00	2.900.072,45	2,56	164,40	2.900.072,45	2,56	-	-	-	2,56
III.	PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP											
1	Pek. List Plank 3/25 GRC	30,00	66.120,00	1.983.600,00	1,75	30,00	1.983.600,00	1,75	-	-	-	1,75
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal 0,3mm	128,19	118.930,00	15.246.003,94	13,47	89,74	10.672.202,76	9,43	38,46	4.573.801,18	4,04	13,47
3	Pek. Nok Bubungan Genteng Metal 0,3mm	13,80	97.310,00	1.342.878,00	1,19	6,90	671.439,00	0,59	6,90	671.439,00	0,59	1,19
4	Pek. Rangka Atap Baja Ringan (type Limasan)	102,38	331.850,00	33.973.143,75	30,03	102,38	33.973.143,75	30,03	-	-	-	30,03
IV.	PEKERJAAN PLAFOND											
1	Pek. Rangka hollow 40.40	97,46	146.800,00	14.306.614,20	12,64	-	-	-	97,46	14.306.614,20	12,64	12,64
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	85,76	53.910,00	4.623.132,92	4,09	-	-	-	77,18	4.160.819,62	3,68	3,68
3	Pek. List Plafond 3/3	52,38	49.160,00	2.575.000,80	2,28	-	-	-	-	-	-	-
V.	PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK											
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	68,59	152.750,00	10.476.740,63	9,26	48,01	7.333.718,44	6,48	20,58	3.143.022,19	2,78	9,26
VI.	PEKERJAAN PENGECATAN Dan PENUTUP DINDING											
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	206,70	27.470,00	5.677.947,36	5,02	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Cat Plafond berikut plamir	85,76	32.250,00	2.765.647,13	2,44	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	23,95	103.570,00	2.480.087,22	2,19	-	-	-	-	-	-	-
VII.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK											
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	2,00	87.430,00	174.860,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-
2	Pas. Instalasi titik Lampu	5,00	682.380,00	3.411.900,00	3,02	-	-	-	-	-	-	-

VIII.	PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI											
1	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	20,00	44.900,00	898.000,00	0,79	-	-	-	-	-	-	-
2	Pas. Grendel Jendela	10,00	66.200,00	662.000,00	0,59	-	-	-	-	-	-	-
3	Pas Kunci Tanam Biasa	1,00	275.800,00	275.800,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				113.148.225,62	100,00		66.908.973,62	59,13		26.855.696,19	23,73	82,87

Mengetahui
Ketua P2SP



(Ketut Suarjana)

Tim Teknis (Pengawas)



(I Gusti Putu Meindrawan, S.T.)

Seririt, 19 September 2026
Kepala Pelaksana,



(I M Panji Pradana, S.Pd)

PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Ruang Kelas 9G/7F

Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 SERIRIT

Minggu/Bulan ke : 7 / II

NPSN : 50100321

Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

Kab/Kota : BULELENG

Provinsi : BALI

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	
I.	PEK. PERSIAPAN											
1	Pek. Bongkar Rangka Atap Genteng dan Reng Stuktur Kayu	132,51	14.200,00	1.881.642,00	1,66	132,51	1.881.642,00	1,66	-	-	-	1,66
2	Pek. Bongkar Kuda-Kuda/ Gording/ Balok Kayu	1,51	1.573.560,00	2.381.639,71	2,10	1,51	2.381.639,71	2,10	-	-	-	2,10
3	Pek. Bongkar Plapond Termasuk Rangka Kayu/ Hollow	104,80	17.280,00	1.810.926,72	1,60	104,80	1.810.926,72	1,60	-	-	-	1,60
II.	PEKERJAAN BETON											
1	Pek. Beton Ring Balok 1:2:3 (R3 15/20)	0,96	1.545.730,00	1.483.900,80	1,31	0,96	1.483.900,80	1,31	-	-	-	1,31
2	Pasang bekisting untuk balok + bongkar	27,20	66.790,00	1.816.688,00	1,61	27,20	1.816.688,00	1,61	-	-	-	1,61
3	Pembesian dengan besi polos atau ulir	164,40	17.640,00	2.900.072,45	2,56	164,40	2.900.072,45	2,56	-	-	-	2,56
III.	PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP											
1	Pek. List Plank 3/25 GRC	30,00	66.120,00	1.983.600,00	1,75	30,00	1.983.600,00	1,75	-	-	-	1,75
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal 0,3mm	128,19	118.930,00	15.246.003,94	13,47	128,19	15.246.003,94	13,47	-	-	-	13,47
3	Pek. Nok Bubungan Genteng Metal 0,3mm	13,80	97.310,00	1.342.878,00	1,19	13,80	1.342.878,00	1,19	-	-	-	1,19
4	Pek. Rangka Atap Baja Ringan (type Limasan)	102,38	331.850,00	33.973.143,75	30,03	102,38	33.973.143,75	30,03	-	-	-	30,03
IV.	PEKERJAAN PLAFOND											
1	Pek. Rangka hollow 40.40	97,46	146.800,00	14.306.614,20	12,64	-	-	-	97,46	14.306.614,20	12,64	12,64
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	85,76	53.910,00	4.623.132,92	4,09	-	-	-	68,61	3.698.506,33	3,27	3,27
3	Pek. List Plafond 3/3	52,38	49.160,00	2.575.000,80	2,28	-	-	-	-	-	-	-
V.	PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK											
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	68,59	152.750,00	10.476.740,63	9,26	-	-	-	68,59	10.476.740,63	9,26	9,26
VI.	PEKERJAAN PENGECATAN Dan PENUTUP DINDING											
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	206,70	27.470,00	5.677.947,36	5,02	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Cat Plafond berikut plamir	85,76	32.250,00	2.765.647,13	2,44	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	23,95	103.570,00	2.480.087,22	2,19	-	-	-	-	-	-	-
VII.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK											
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	2,00	87.430,00	174.860,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-
2	Pas. Instalasi titik Lampu	5,00	682.380,00	3.411.900,00	3,02	-	-	-	-	-	-	-

VIII.	PEKERJAAN PENGANTUNG / PENGUNCI											
1	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	20,00	44.900,00	898.000,00	0,79	-	-	-	-	-	-	-
2	Pas. Grendel Jendela	10,00	66.200,00	662.000,00	0,59	-	-	-	-	-	-	-
3	Pas Kunci Tanam Biasa	1,00	275.800,00	275.800,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				113.148.225,62	100,00		64.820.495,37	57,29		28.481.861,16	25,17	82,46

Mengetahui
Ketua P2SP


(Ketut Suarjana)

Tim Teknis (Pengawas)


(I Gusti Putu Meindrawan, S.T.)

Seririt, 19 September 2026
Kepala Pelaksana,


(I M Panji Pradana, S.Pd)

PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Ruang Kelas K.1

Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 SERIRIT

NPSN : 50100321

Kab/Kota : BULELENG

Provinsi : BALI

Minggu/Bulan ke : 7 / II

Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	
I.	PEK. PERSIAPAN											
1	Pek. Bongkar Lantai Keramik	76,37	37.310,00	2.849.457,98	4,28	76,37	2.849.457,98	4,28	-	-	-	4,28
II.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
1	Pembuatan Daun Pintu 2 Panel	4,41	882.600,00	3.892.266,00	5,85	-	-	-	-	-	-	-
2	Daun Jendela J1	5,11	1.186.290,00	6.061.941,90	9,11	-	-	-	-	-	-	-
3	Kaca Mati 5 m2	5,11	443.650,00	2.265.720,55	3,41	-	-	-	-	-	-	-
III.	PEKERJAAN PLAFOND											
1	Pek. Rangka hollow 40.40	85,76	146.800,00	12.589.054,20	18,92	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	85,76	53.910,00	4.623.132,92	6,95	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. List Plafond 3/3	54,78	49.160,00	2.692.984,80	4,05	-	-	-	-	-	-	-
IV.	PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK											
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	68,59	152.750,00	10.476.740,63	15,75	68,59	10.476.740,63	15,75	-	-	-	15,75
V.	PEKERJAAN PENGECATAN Dan PENUTUP DINDING											
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	98,34	27.470,00	2.701.509,68	4,06	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior	133,38	27.470,00	3.663.943,11	5,51	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	85,76	32.250,00	2.765.647,13	4,16	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	23,95	103.570,00	2.480.087,22	3,73	-	-	-	-	-	-	-
VI.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK											
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	2,00	87.430,00	174.860,00	0,26	-	-	-	-	-	-	-
2	Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM	2,00	1.023.630,00	2.047.260,00	3,08	-	-	-	-	-	-	-
3	Pas. Instalasi titik Lampu	5,00	682.380,00	3.411.900,00	5,13	-	-	-	-	-	-	-

VII.	PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI											
1	Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)	6,00	83.000,00	498.000,00	0,75	-	-	-	-	-	-	-
2	Pas. Engsel Jendela 3" (2bh/jendela)	20,00	61.700,00	1.234.000,00	1,85	-	-	-	-	-	-	-
3	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	20,00	44.900,00	898.000,00	1,35	-	-	-	-	-	-	-
4	Pas. Grendel Jendela	10,00	66.200,00	662.000,00	0,99	-	-	-	-	-	-	-
5	Pas Kunci Tanam Biasa	2,00	275.800,00	551.600,00	0,83	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			66.540.106,10	100,00		13.326.198,60	20,03		-	-	20,03	

Mengetahui
Ketua P2SP



(Ketut Suarjana)

Tim Teknis (Pengawas)



(I Gusti Putu Meindrawan, S.T.)

Seririt, 19 September 2026
Kepala Pelaksana,



(I M Panji Pradana, S.Pd)

PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Ruang Kelas K.1

Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 SERIRIT
 NPSN : 50100321
 Kab/Kota : BULELENG
 Provinsi : BALI

Minggu/Bulan ke : 7 / II
 Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	
I.	PEK. PERSIAPAN											
1	Pek. Bongkar Lantai Keramik	76,37	37.310,00	2.849.457,98	4,38	76,37	2.849.457,98	4,38	-	-	-	4,38
II.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
1	Pembuatan Daun Pintu 2 Panel	4,41	882.600,00	3.892.266,00	5,98	-	-	-	-	-	-	-
2	Daun Jendela J1	3,92	1.186.290,00	4.650.256,80	7,14	-	-	-	-	-	-	-
3	Kaca Mati 5 m2	5,11	443.650,00	2.265.720,55	3,48	-	-	-	-	-	-	-
III.	PEKERJAAN PLAFOND											
1	Pek. Rangka hollow 40.40	85,76	146.800,00	12.589.054,20	19,33	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	85,76	53.910,00	4.623.132,92	7,10	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. List Plafond 3/3	54,78	49.160,00	2.692.984,80	4,13	-	-	-	-	-	-	-
IV.	PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK											
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	68,59	152.750,00	10.476.740,63	16,09	48,01	7.333.718,44	11,26	20,58	3.143.022,19	4,83	16,09
V.	PEKERJAAN PENGECATAN Dan PENUTUP DINDING											
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	98,34	27.470,00	2.701.509,68	4,15	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior	133,38	27.470,00	3.663.943,11	5,63	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	85,76	32.250,00	2.765.647,13	4,25	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	23,95	103.570,00	2.480.087,22	3,81	-	-	-	-	-	-	-
VI.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK											
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	2,00	87.430,00	174.860,00	0,27	-	-	-	-	-	-	-
2	Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM	2,00	1.023.630,00	2.047.260,00	3,14	-	-	-	-	-	-	-
3	Pas. Instalasi titik Lampu	5,00	682.380,00	3.411.900,00	5,24	-	-	-	-	-	-	-

VII.	PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI											
1	Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)	6,00	83.000,00	498.000,00	0,76	-	-	-	-	-	-	-
2	Pas. Engsel Jendela 3" (2bh/jendela)	20,00	61.700,00	1.234.000,00	1,89	-	-	-	-	-	-	-
3	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	20,00	44.900,00	898.000,00	1,38	-	-	-	-	-	-	-
4	Pas. Grendel Jendela	10,00	66.200,00	662.000,00	1,02	-	-	-	-	-	-	-
5	Pas Kunci Tanam Biasa	2,00	275.800,00	551.600,00	0,85	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			65.128.421,00	100,00			10.183.176,41	15,64		3.143.022,19	4,83	20,46

Mengetahui
Ketua P2SP



(Ketut Suarjana)

Tim Teknis (Pengawas)



(I Gusti Putu Meindrawan, S.T.)

Seririt, 19 September 2026
Kepala Pelaksana,



(I M Panji Pradana, S.Pd)

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
LAB. KOMPUTER**

Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 SERIRIT
NPSN : 50100321
Kab/Kota : BULELENG
Provinsi : BALI

Minggu/Bulan ke : 7 / II
Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	
I.	PEK. PERSIAPAN											
1	Pek. Bongkar Rangka Atap Genteng dan Reng Stuktur Kayu	265,02	14.200,00	3.763.284,00	1,69	265,02	3.763.284,00	1,69	-	-	-	1,69
2	Pek. Bongkar Kuda-Kuda/ Gording/ Balok Kayu	1,75	1.573.560,00	2.751.438,90	1,23	1,75	2.751.438,90	1,23	-	-	-	1,23
3	Pek. Bongkar Plapond Termasuk Rangka Kayu/ Hollow	226,38	17.280,00	3.911.811,84	1,76	226,38	3.911.811,84	1,76	-	-	-	1,76
IV.	PEKERJAAN BETON											
1	Pek. Beton Ring Balok 1:2:3 (R3 15/20)	2,04	1.545.730,00	3.153.289,20	1,41	2,04	3.153.289,20	1,41	-	-	-	1,41
2	Pasang bekisting untuk balok + bongkar	57,80	66.790,00	3.860.462,00	1,73	57,80	3.860.462,00	1,73	-	-	-	1,73
3	Pembesian dengan besi polos atau ulir	349,36	17.640,00	6.162.653,95	2,77	349,36	6.162.653,95	2,77	-	-	-	2,77
VII.	PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP											
1	Pek. List Plank 3/25 GRC	60,00	66.120,00	3.967.200,00	1,78	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal 0,3mm	280,80	118.930,00	33.396.008,64	14,98	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Nok Bubungan Genteng Metal 0,3mm	21,00	97.310,00	2.043.510,00	0,92	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Rangka Atap Baja Ringan (type Limasan)	224,25	331.850,00	74.417.362,50	33,39	44,85	14.883.472,50	6,68	156,98	52.092.153,75	23,37	30,05
VIII.	PEKERJAAN PLAFOND											
1	Pek. Rangka hollow 40.40	220,09	146.800,00	32.308.478,00	14,50	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	220,09	53.910,00	11.864.782,35	5,32	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. List Plafond 3/3	119,52	49.160,00	5.875.603,20	2,64	-	-	-	-	-	-	-
IX.	PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK											
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	34,45	152.750,00	5.262.084,75	2,36	-	-	-	-	-	-	-
X.	PEKERJAAN PENGECATAN Dan PENUTUP DINDING											
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	546,73	27.470,00	15.018.541,24	6,74	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Cat Plafond berikut plamir	171,51	32.250,00	5.531.294,25	2,48	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	29,72	103.570,00	3.077.727,55	1,38	-	-	-	-	-	-	-
XI.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK											
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	2,00	87.430,00	174.860,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-
2	Pas. Instalasi titik Lampu pijar	5,00	682.380,00	3.411.900,00	1,53	-	-	-	-	-	-	-

XII.	PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI											
1	Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)	9,00	83.000,00	747.000,00	0,34	-	-	-	-	-	-	-
2	Pas. Engsel Jendela 3" (2bh/jendela)	14,00	61.700,00	863.800,00	0,39	-	-	-	-	-	-	-
3	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	14,00	44.900,00	628.600,00	0,28	-	-	-	-	-	-	-
4	Pas. Grendel Jendela	2,00	66.200,00	132.400,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-
5	Pas Kunci Tanam Biasa	2,00	275.800,00	551.600,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			222.875.692,37	100,00			38.486.412,39	17,27		52.092.153,75	23,37	40,64

Mengetahui
Ketua P2SP



(Ketut Suarjana)

Tim Teknis (Pengawas)



(I Gusti Putu Meindrawan, S.T.)

Seririt, 19 September 2026
Kepala Pelaksana,



(I M Panji Pradana, S.Pd)

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
JALAN MASUK (ENTRANCE) UTAMA DARI GERBANG KE KANTOR**

Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 SERIRIT
NPSN : 50100321
Kab/Kota : BULELENG
Provinsi : BALI

Minggu/Bulan ke : 7 / II
Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	
I.	PEK. JALAN MASUK (ENTRANCE) UTAMA DARI GERBANG KE KANTOR											
1	Pek. Galian Tanah	5,04	48.000,00	241.920,00	0,49	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Urugan Pasir	5,35	493.200,00	2.638.620,00	5,32	-	-	-	-	-	-	-
3	Beton Tumbuk 1: 3 : 5	0,28	1.233.470,00	345.371,60	0,70	-	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Paving Block Natural (6 cm)	107,00	433.020,00	46.333.140,00	93,49	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				49.559.051,60	100,00		-	-		-	-	

Mengetahui
Ketua P2SP



(Ketut Suarjana)

Tim Teknis (Pengawas)



(I Gusti Putu Meindrawan, S.T.)

Seririt, 19 September 2026
Kepala Pelaksana,



(I M Panji Pradana, S.Pd)

DOKUMENTASI PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

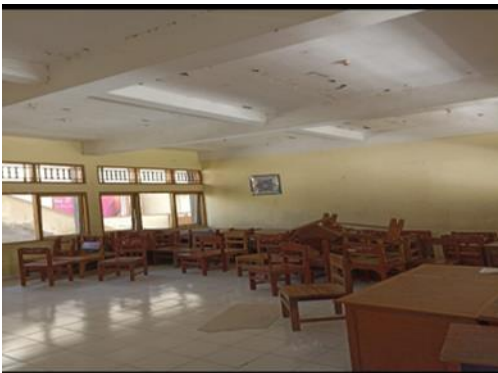
Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Seririt
 NPSN : 50100321
 Kab/Kota : Buleleng
 Provinsi : Bali
 Menu
 Volume

Minggu/Bulan Ke : 7/II
 Periode Tanggal : 14 September s/d 19 September 2026

Menu	Volume	Ket	Foto 0 %	Foto Progres 40,25%
Rehabilitasi Ruang Kelas	1	9E/7E		
				

				
Rehabilitasi Ruang Kelas	1	9G/7F	 	 

			 Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali --, Indonesia Lat -8.199885, Long 114.933754 Elev. 12/08/2026 11:52 AM GMT+08:00 Note : Captured by GPS Map Camera	 RW5M+WF3, Jl. Udayana, Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali 81153, Indonesia 21 Sep 2026 11:46 AM
Rehabilitasi Ruang Kelas	1	K.1	 RW5M+WF3, Jl. Udayana, Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali 81153, Indonesia 12 Agu 2026 10:59 AM clear sky 30.0 °C	 RW5M+WF3, Jl. Udayana, Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali 81153, Indonesia 21 Sep 2026 11:33 AM few clouds 31.0 °C

			 RWSM+WF3, Jl. Udayana, Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali 81153, Indonesia broken clouds 28.0 °C 15 Agu 2026 08:53 AM	 10:59/7:48 AM 100° E Jalan Udayana Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Bali Altitude: 63.5m Snm Speed: 0.0 km/h Index number: 194
			 RWSM+WF3, Jl. Udayana, Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali 81153, Indonesia clear sky 30.0 °C 12 Agu 2026 11:08 AM	 Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia Jalan Seririt-Singaraja, Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali --, Indonesia Lat -8.190040, Long 114.933794 Seririt, 21/09/2026 11:04 AM GMT+08:00 Note : Captured by GPS Map Camera

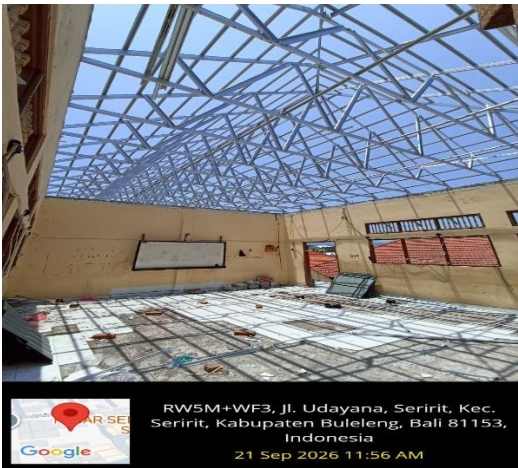
Rehabilitasi Ruang
Kelas

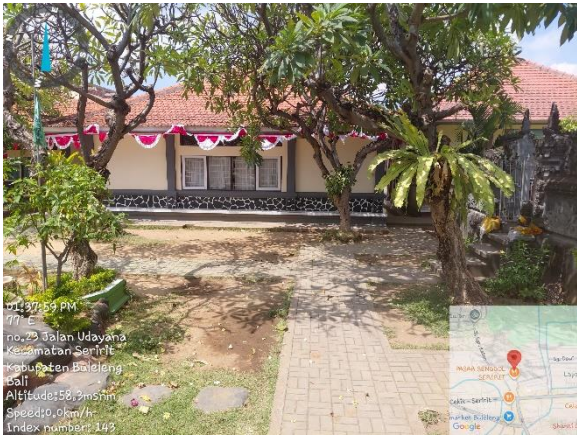
1

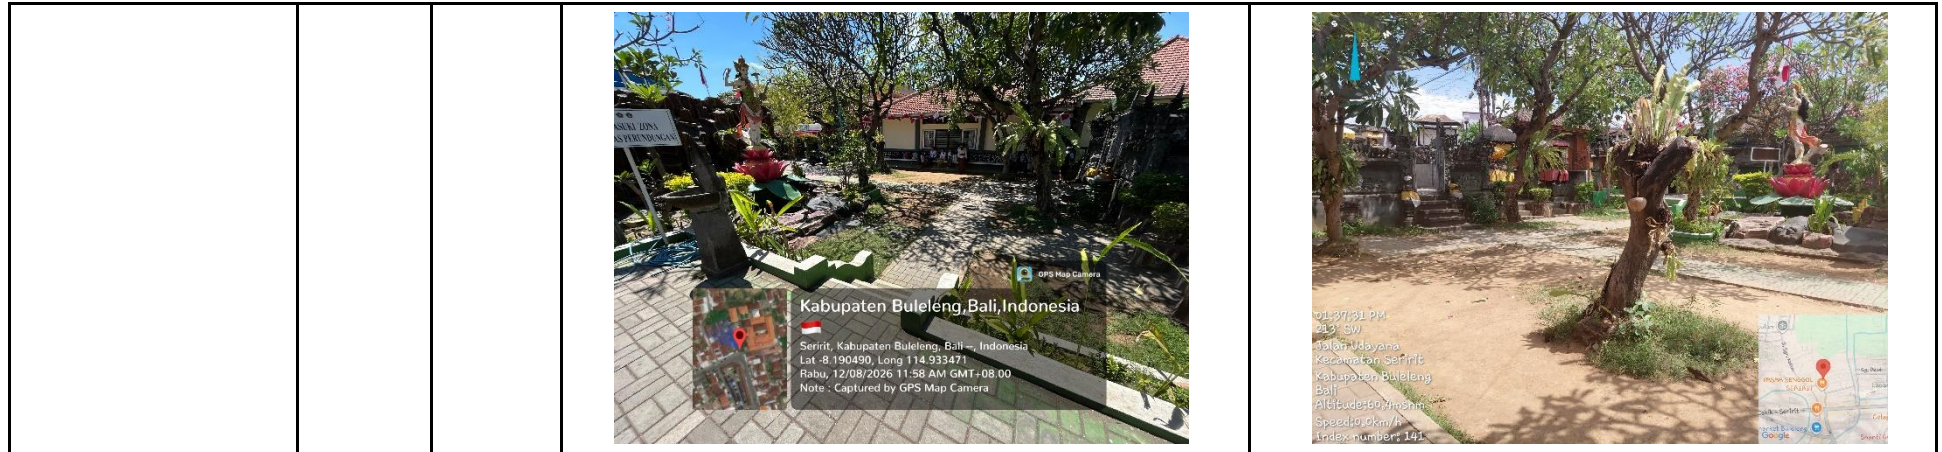
K.2



			 RWSM+WF3, Jl. Udayana, Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali 81153, Indonesia clear sky 12 Agu 2026 10:59 AM	 Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia Jalan Seririt-Singaraja, Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali -, Indonesia Lat -8.190120, Long 114.933608 Seririt, 21/09/2026 11:03 AM GMT+08.00 Note : Captured by GPS Map Camera
Rehabilitasi Ruang Lab Komputer	2	Lab Komputer	 RWSM+WF3, Jl. Udayana, Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali 81153, Indonesia clear sky 12 Agu 2026 11:17 AM	 RWSM+WF3, Jl. Udayana, Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali 81153, Indonesia 21 Sep 2026 12:32 PM

			 Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali -- Indonesia Lat : 8.190145, Long 114.933859 Rabu, 12/08/2026 11:46 AM GMT+08:00 Note : Captured by GPS Map Camera	 RW5M+WF3, Jl. Udayana, Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali 81153, Indonesia few clouds 31.0 °C 21 Sep 2026 11:33 AM
			 RW5M+WF3, Jl. Udayana, Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali 81153, Indonesia clear sky 30.0 °C 12 Agu 2026 11:11 AM	 RW5M+WF3, Jl. Udayana, Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali 81153, Indonesia Indonesia 21 Sep 2026 11:56 AM

Jalan Masuk (Entrance) Utama Dari Gerbang Ke Kantor	1	Penataan Lingkung an		
				




Seririt, 19 September 2026

Mengetahui,
Ketua P2SP


 (Ketut Suarjana)

Tim Teknis (Pengawas)


 (I Gusti Putu Meindrawan, S.T.)

Kepala Pelaksana


 (I M Ranji Pradana, S.Pd)
